



## Armazenamento de Material

### 1. Generalidades

Ficará a cargo da contratada a carga e o transporte de todos os materiais necessários para a execução das obras.

O material estará disponível para empresa Contratada no mínimo 7 dias antes do início da obra e todos serão entregues em perfeitas condições e a Contratada será responsabilizada por quaisquer danos causados nos materiais em função de manuseio, transporte ou armazenamento inadequados, exposição a elementos agressivos enquanto o material estiver sob sua guarda, ou utilização incorreta no âmbito da obra. Em caso de danos aos materiais os mesmos deverão ser ressarcidos da execução da obra, por conta da empresa contratada.

Em caso de a mesma não ressarcir, a fiscalização não liberará a última fatura da contratada, até que os mesmos sejam entregues a Prefeitura.

### 2. Materiais

- Tubos: Serão armazenados na posição vertical e seus locais e quantidades de armazenamentos estão devidamente indicados em anexo.
- Blocos de Pavimentação: Serão empilhados até uma altura máxima de 3m em paletes de (1,00 x 1,00)m e seus locais e quantidades de armazenamentos estão devidamente indicados em anexo.
- Meio Fio de Concreto: Estarão devidamente armazenados e seus locais e quantidades de armazenamentos estão devidamente indicados em anexo.

### 3. Locais de Armazenamento

Os materiais estarão disponíveis em 3 locais próximos a obra:

Na Secretaria de Obras e Viação, localizada a Rua Altamir de Lacerda Nº 930, na Área do Camping do Cassino localizado na Rua Cel. Leivas Otero s/ nº e na usina de asfalto na Vila da Quinta.




PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE  
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL INTEGRADO  
RIO GRANDE 2010 UMA VISÃO DE FUTURO




O local da estocagem deve ser plano, com declividade mínima, limpo, livre de pedras ou objetos salientes e garantir ao material o devido umedecimento e proteção contra ações do sol e do vento.

O local da estocagem possui espaço suficiente para transporte e manuseio de carga e descarga do material e suas dimensões e capacidades de armazenamento estão devidamente indicadas em anexo.

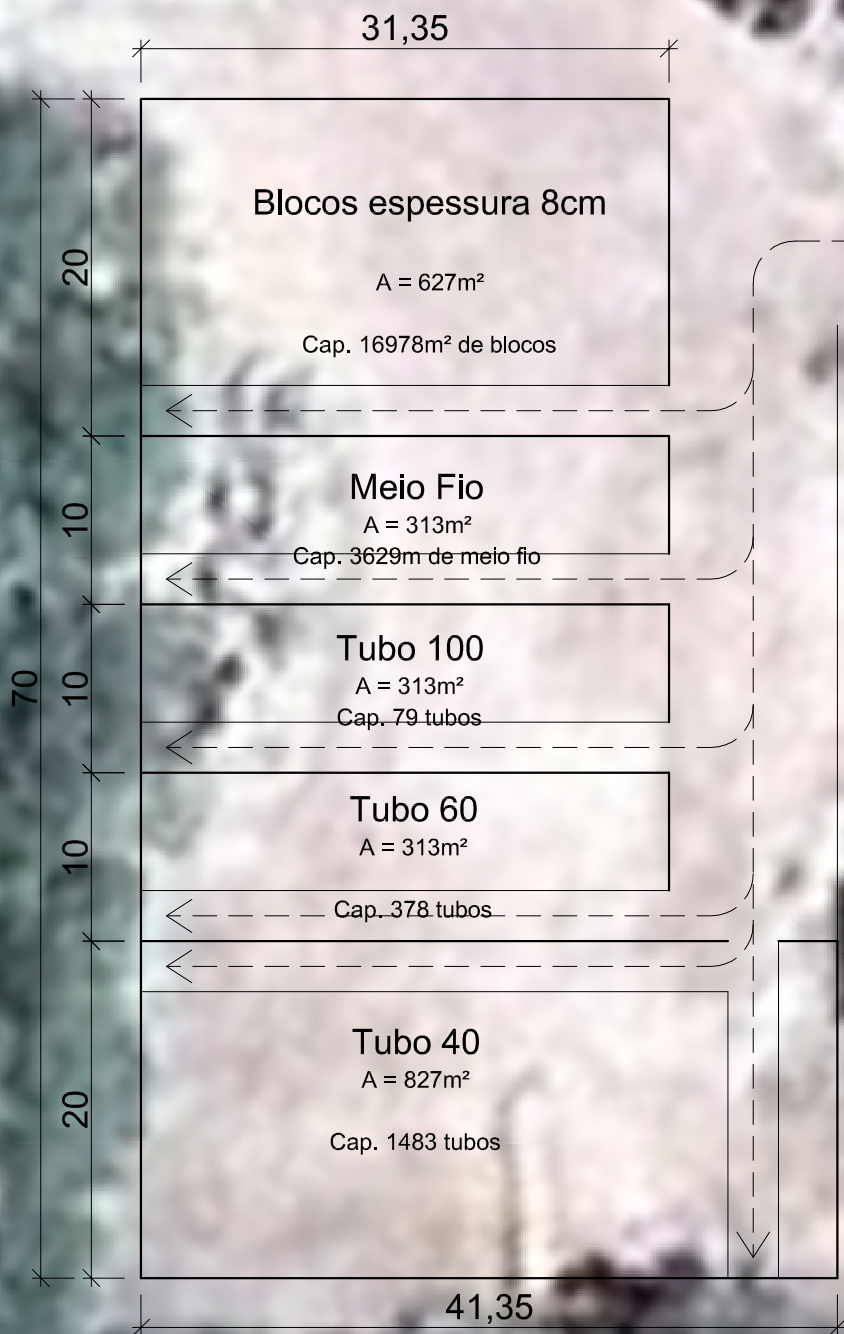


Circulação

SMOV

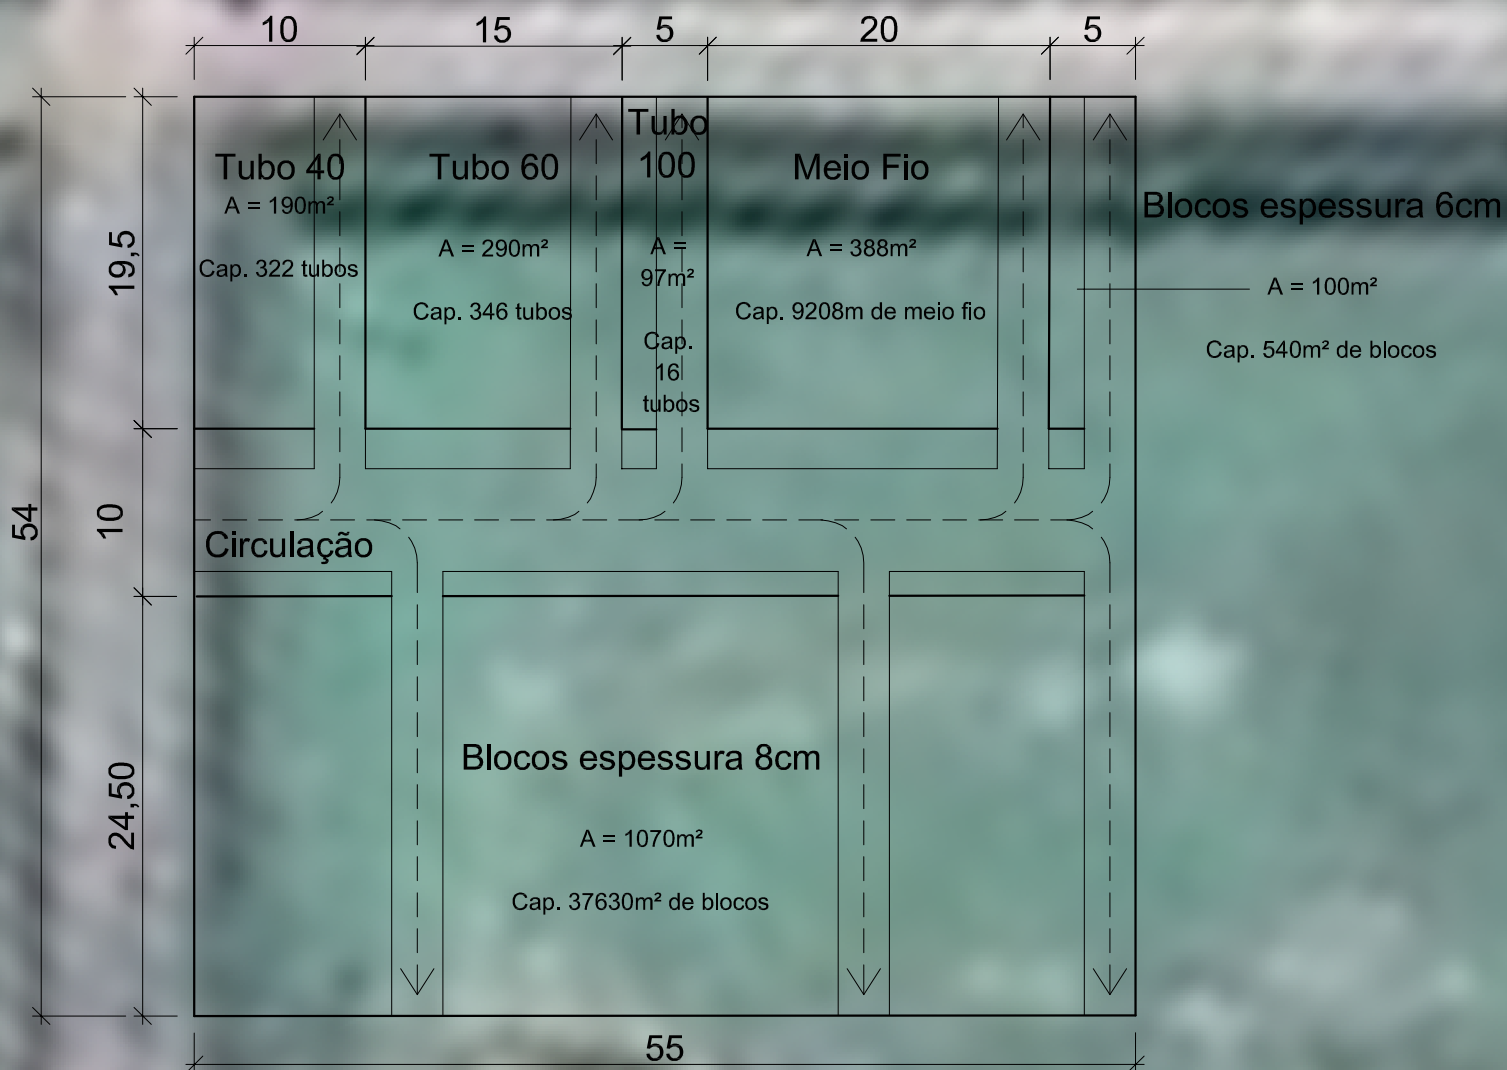

Camping - Cassino



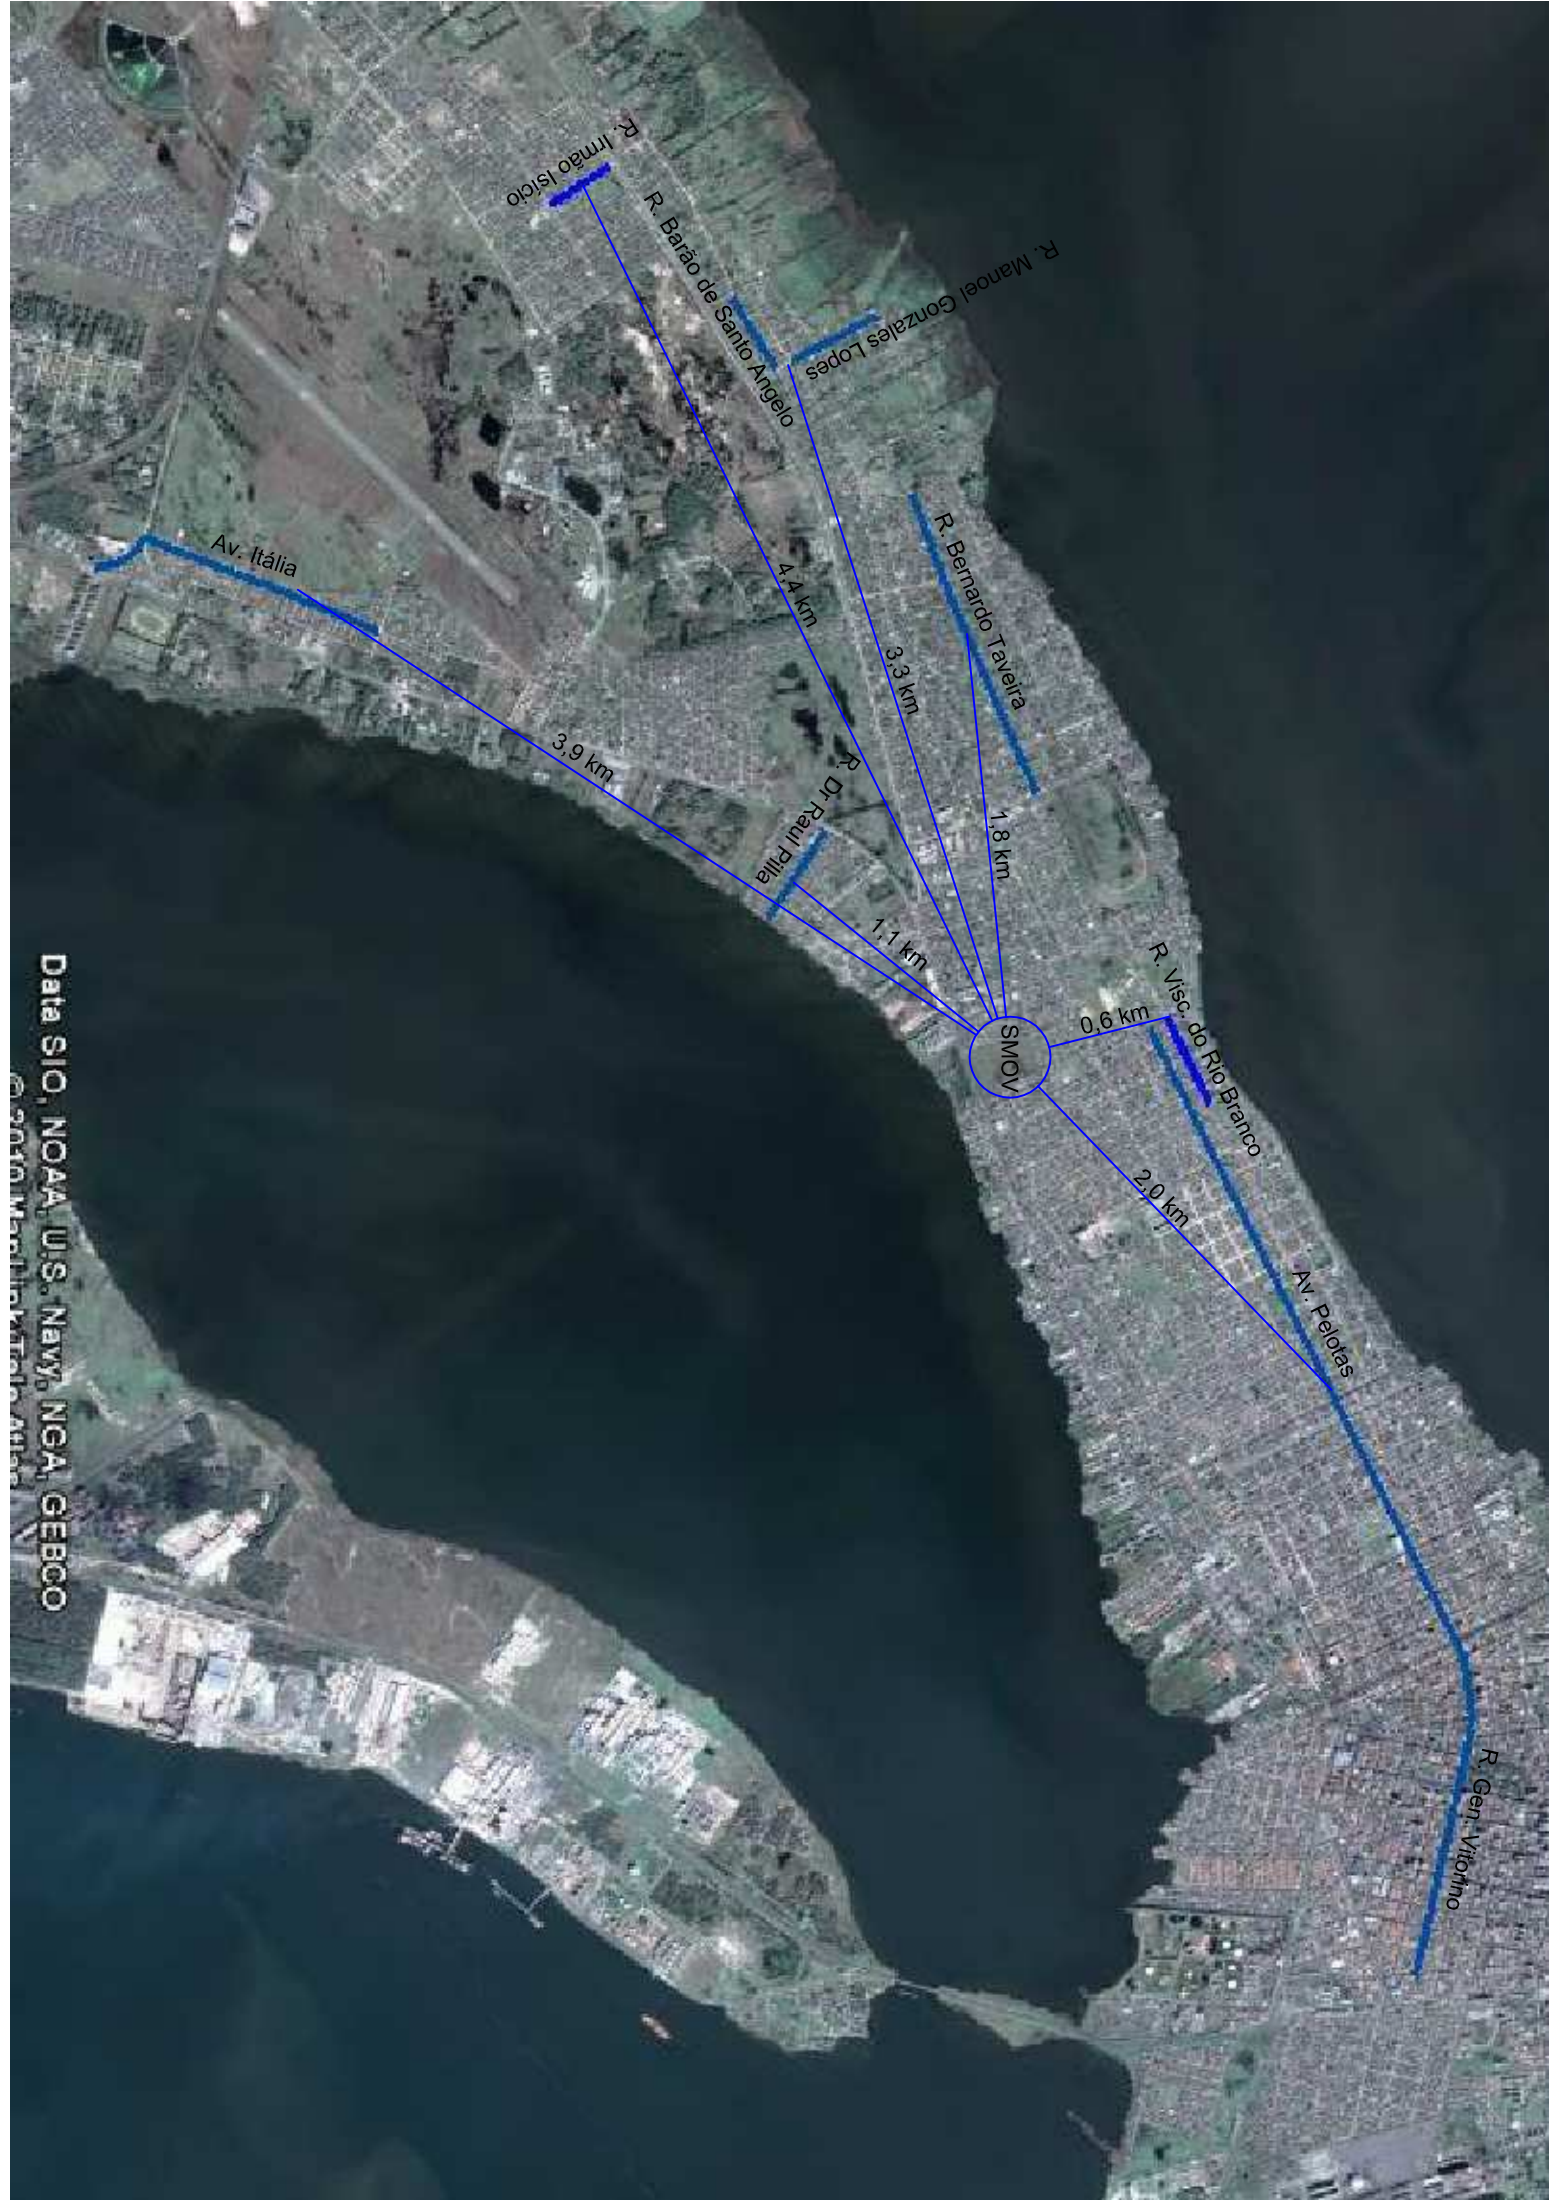

Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO  
© 2010 Mapbox, Mapbox, Atlas





Av. Atlântica

Av. Rio Grande

2,4 km

1,3 km

1,8 km

Camping



Acesso as Ilhas

0,5 km

Usina  
de  
Asfalto

Data SIO, NOAA  
© 2010
